

第7回寄居スマートインターチェンジ 地区協議会資料


令和3年1月

目次

1. 事業範囲
2. 現在の進捗状況
3. 上り線の供用開始日について

1. 事業範囲

(路線名) 関越自動車道 新潟線

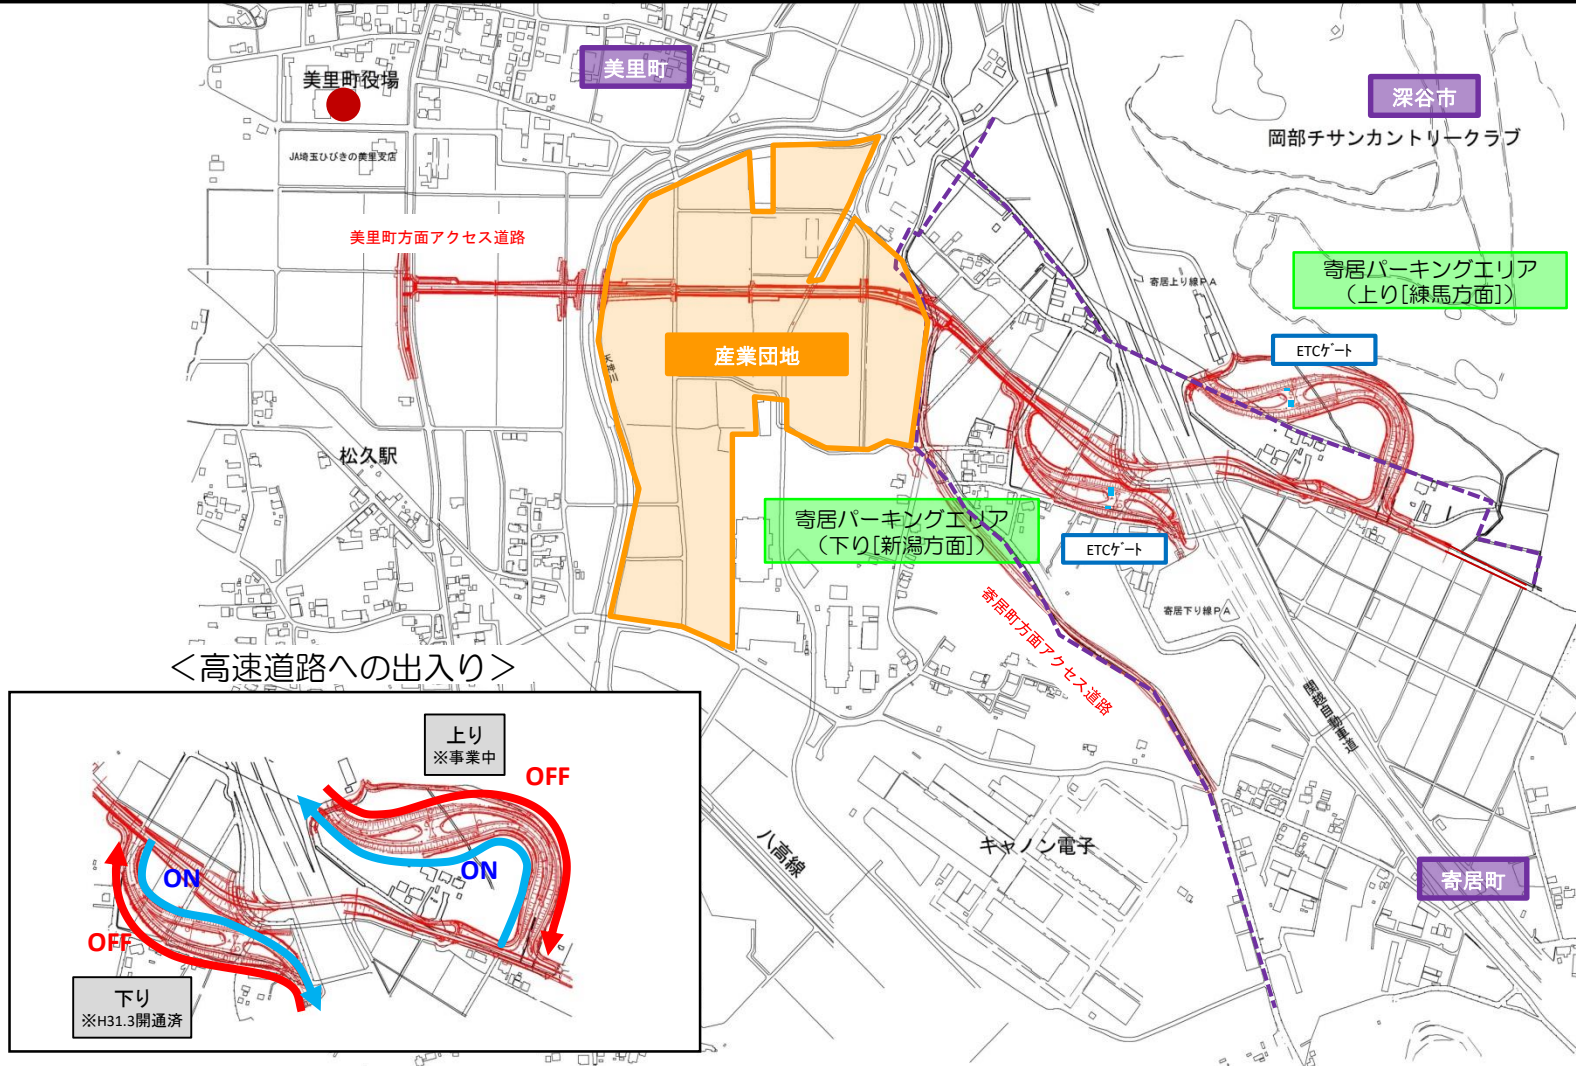

2. 現在の進捗状況

【上り線側】

舗装まで施工完了



【下り線側】

平成31年3月28日に先行開通



3. 上り線の供用開始日について

寄居スマートICの上り線について、工事完成の見通しが立ったことから、上り線の供用開始日を下記のとおりといたします。

○供用開始日(上り線)

令和 3年3月28日
